

2on. Informe de Seguiment

**"CENTRE EDUCATIU A TOUBACOUTA"
Senegal**

Mataró, desembre de 2003

**Construcció d'un
"CENTRE EDUCATIU A TOUBAKOUTA"**

Número de projecte: 905	
Nom del projecte: "CENTRE EDUCATIU A TOUBAKOUTA"	
País: SENEGAL	Àrea geogràfica: ÀFRICA
Període de l'informe: ANY 2003, de juny a desembre (Projecte presentat el 2002)	
Organització executora: "ASSOCIACIÓ D'AMICS DE L'ESCOLA PIA AL SENEGAL"	
Data d'elaboració de l'informe: DESEMBRE 2003	

1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Centre d'acollida i de formació per a **infants i joves de la regió de Niombató**, que viuen en petites poblacions disperses pel territori (selva), i per aquest motiu no poden assistir a l'escola de secundària.

2. COMPROMISOS

L'Associació d'Amics de l'Escola Pia al Senegal ES VA COMPROMETRE, tal com consta en el projecte presentat al FCCD en la convocatòria corresponent a l'any 2002, a recollir els recursos necessaris per fer possible la construcció a Toubacouta, Senegal, d'un **centre d'acollida i de formació** per a **infants i joves de la regió de Niombató**, que viuen en petites poblacions disperses pel territori (selva), on no hi ha escoles de secundària i no tenen mitjans per a desplaçar-se a diari o trobar una residència que els permeti seguir els seus estudis.

També ens hem compromès amb la sensibilització de la nostra societat pel que fa a quines són les necessitats d'aquell país africà, fomentant la participació ciutadana en temes de cooperació i solidaritat internacional, i de manera especial entre els nois i les noies que aquí poden disposar de totes les comoditats i accedir a la seva formació.

3. DESCRIPCIÓ DEL MECANISME D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE

L'Associació d'Amics de l'Escola Pia al Senegal va fer seu el projecte de construcció d'un **CENTRE EDUCATIU A TOUBACOUTA**, mentre que l'Escola Pia de Catalunya al Senegal, a través de l'Associació Senegal Solidari, representada per Josep Artigas i Manuel Sales, aquest darrer com a responsable del projecte, és la responsable de la construcció i contracta empreses locals, actuant així com a contrapart.

El projecte es va presentar al FCCD, amb el suport de l'Ajuntament de Mataró, per demanar l'ajut a través de les subvencions municipals per a projectes de solidaritat i cooperació, i va rebre una valoració molt positiva, tant pels beneficis que ha de comportar per als nois i les noies de la zona, com per la seva viabilitat.

Tal com es va fer constar en l'informe de seguiment anterior, s'ha editat un díptic de fàcil distribució i comprensió per ajudar a la difusió i sensibilització. Durant tot l'any 2002 es van fer un seguit d'intervencions en els mitjans de comunicació per difondre els objectius de l'entitat i també del projecte en marxa (activitat que queda reflectida a la memòria corresponent a l'exercici de 2002).

Durant l'any 2003 s'ha tramès la memòria de l'entitat, corresponent a l'any 2002, i l'informe de seguiment corresponent al primer semestre del 2003, pel que fa a la construcció del centre, a tots els ajuntaments de la comarca del Maresme, obtenint el compromís d'alguns d'ells d'aportar la seva col·laboració en el proper exercici. Igualment s'ha aprofitat l'estada a Catalunya del P. Manel Sales per fer trobades amb els associats, visitar a l'alcalde de Mataró per agrair-li la col·laboració del municipi i aparèixer davant les càmeres de Televisió de Mataró explicant el projecte i la finalitat educadora que persegueix.

La construcció sobre el terreny és seguida pel P. Manuel Sales, que periòdicament ens fa arribar documentació, bàsicament factures i fotografies, acompanyada de les seves explicacions sobre el desenvolupament del projecte. A més, durant aquest any, persones relacionades amb la nostra entitat, com són el P. Jaume Pallarolas, provincial de l'Escola Pia a Catalunya i el P. Manuel Bagunyà, assistent del pare provincial per a temes referents a la col·laboració en el desenvolupament de països com el Senegal, han visitat les obres. Igualment ens consta la visita de responsables del FCCD durant l'any que ara s'acaba.

4. CRONOGRAMA I DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL PROCÉS

Juliol 2003

Arriben les primeres pluges. Tothom està molt content. Nosaltres també causa de la mala collita del darrer any. Ja tenim tots els dormitoris acabats i les sales d'estudi. Cal acabar els serveis. Hem de fer un forat a la tanca perquè l'aigua pugui sortir del recinte i anar cap el braç de mar que tenim no gaire lluny del nou centre. No hem posat el lavabo. Ens cal reestudiar el lloc on es rentaran la cara i les mans els alumnes.

Agost 2003

La pluja no ens permet de continuar les construccions. Ens queda el dipòsit per fer. Aprofitem que tenim una bona parcel·la i hi plantem blat de moro. Volem que ens serveixi per alimentar els nostres interns quan vinguin els primers dies. Comencen a inscriure's els primers alumnes. Els dormitoris serveixen ja per acollir un grup de mestres del cicle primari que vénen a Toubacouta per fer un curset sobre pedagogia.

Setembre 2003

Ja veiem que tindrem problemes amb els micos. Quan no estem al centre ells vénen i es mengen el blat de moro encara verd. Continuen les inscripcions encara que tímidament. Ja veiem que hi haurà més nois que noies. En el lloc on no hem conreat l'herba és molt alta. L'associació de joves de Toubacouta ve per desherbar gratuïtament. Consideren el centre com una cosa d'ells.

Octubre 2003

Ja tenim inscrits vint nois i noies. Donem el dia 2 com a darrer dia per acceptar les inscripcions per omplir les places que tenim, que són 24. Ens trobem que hi ha vuit nois i noies que esperen amb la inscripció a la mà. Decidim d'agafar-los tots. Farem una altra llitera. El dia 3 arriben els llits, les taules i les cadires. Ja tenim les olles i els perols per menjar. El dia 5 al vespre els 28 alumnes són a casa. Distribució d'habitacions i de feines per tarannà de la vida de família que volem portar des del principi. Comença la construcció del dipòsit d'aigua. La tercera setmana comencen les classes al col·legi de l'estat, que tenim al davant, i al qual van tots els nostres joves.

Novembre 2003

Acabem el dipòsit d'aigua que ens permet de tenir aigua tot el dia, ja que fins ara només arriba aigua quatre hores per dia. Dues al matí i dues a la tarda. Els serveis ja estan operatius al cent per cent. Els mateixos alumnes arrangen el terreny, el fan més pla i netegen els llocs que no havien quedat nets d'herba. Les construccions es paren perquè s'han acabat els diners que teníem per fer-ho. Dos dels interns han de canviar d'internat per no tenir els papers per estudiar al col·legi de Toubacouta. Però seran rebuts al nostre Centre de Sokone. Queden 26 interns: deu noies i setze nois. Es fa el projecte pedagògic del Centre.

Desembre 2003

Comencem a fer els plànols del que serà la sala d'estudi que pensem construir al mig del terreny per poder així recuperar les sales actuals i poder doblar la capacitat d'acollida. Podrem ser 48 interns l'any vinent. Continua la formació del monitor encarregat de l'internat. Fem trobades amb els altres directors d'internat d'Oussouye, de Mlomp i dels tres de Sokone.

5. VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE

5.1. Valoració global sobre els resultats, activitats i despeses.

Com s'havia previst, es va obrir el centre als nois i noies dels pobles de rodalies de Toubacouta el dia 5 d'octubre. S'ha de dir que la majoria de les coses estaven acabades i que el monitor, en Benjamin Diouf, havia estat format per aquesta tasca amb l'ajut dels monitors Monique Thiaw, Pierre Mama Diouf i Manel Sales. Aquest darrer, també responsable del control de la construcció del centre.

El primer dia hi havia quasi la totalitat dels nois i noies inscrits, però dos nois i dues noies s'havien apuntat a Sokone sense haver avisat a Toubacouta. Això ens va fer augmentar el nombre de residents a 28 en lloc dels 24 que s'havien previst. Davant la impossibilitat d'enviar-los a casa seva es van fer dues lliteres més i es van comprar quatre matalassos per poder-los acollir. La setmana anterior es va aprofitar per comprar tot el material de cuina i les coses imprescindibles per a la neteja del centre.

El dia 6 d'octubre l'escola de secundària on aniran a estudiar els nois i noies residents al centre no va obrir com estava previst. Es va continuar amb el procés d'inscripció i aquest retard va permetre continuar la neteja de tot el terreny i els voltants de la tanca. Així s'allunyaven les serps que són bastant abundants en aquest sector.

Molt aviat es va poder veure que l'aigua esdevenia el principal problema de la vida al centre. Només hi havia dues hores d'aigua al matí, que coincideixen amb l'hora d'entrada a l'escola i al vespre n'hi havia una hora i mitja. Això ha obligat a la construcció d'un dipòsit per poder guardar l'aigua i tenir-ne durant tot el dia. Aquesta despesa, que no s'havia previst inicialment, ha desequilibrat el pressupost, compensat per un avançament de la caixa de Sokone, esperant l'arribada de les quantitats promeses des de Catalunya. Dos grans dipòsits de mil litres cadascun han fet la vida molt més agradable a tota la família de residents.

Dos dels nois del centre es van adonar que no tindrien la plaça promesa a l'escola de Toubacouta a causa de la manca d'un dels papers necessaris per a la inscripció. La mare demana poder-lo portar al centre que els escolapis tenen a Sokone, i així es va fer. Allà van tenir lloc per continuar estudiant.

La vida al Centre de Toubacouta està organitzada per grups que s'ocupen de les diferents instal·lacions i tasques: cuina, serveis, patis, habitacions. Tots els nois i noies van passant per les diferents activitats i sota la tutoria del monitor vetllen perquè tot estigui net i es mengi a l'hora.

Durant els caps de setmana es realitzen diferents activitats. Fins aquest moment ja hi ha hagut un camp d'escoles, una sessió de formació per a joves dels pobles propers i se n'està preparant una altra, que està previst fer-la el desembre. Les relacions amb la gent del poble són molt bones i no hi ha dia que no vingui algú a preguntar si ja estem fent les inscripcions per a l'any vinent.

La collita del blat de moro que es va sembrar el mes d'agost ha estat un fracàs. Les mones dels boscos propers se l'han menjat gairebé tot. Pel proper any es preveu fer un altre tipus de conreu, com carabasses o síndries.

Els alumnes preparen un hort per col·laborar a la seva subsistència i així poder tenir més variació en els menjars. S'ha de dir que el menú és bastant igual cada dia, com passa en aquest país. L'esmorzar és mill amb sucre, el dinar arròs i peix, i el sopar torna a ser mill i peix, normalment amb salsa de cacauet. Voldríem fer algun dia carn, però caldrà estudiar abans el pressupost més detingudament.

Les hores d'estudi es respecten sempre, i el monitor està a l'aguait. Tots esperen que els resultats seran bons, així com les primeres notes del mes de febrer vinent.

5.2. Valoració sobre el grau de participació social i institucional dels col·lectius implicats i sobre el mecanisme d'execució del projecte.

Una associació de joves del poble de Toubacouta va venir un diumenge per ajudar a tallar i treure l'herba que havia crescut molt durant l'estació de pluges. Al final de la feina se'ls va donar una quantitat simbòlica perquè es comprassin una pilota de futbol per a l'equip del poble.

Per la gent de països industrialitzats, com Catalunya, pot semblar poc important, però és rellevant com s'ha procurat fer coincidir el temps de construcció amb el període que el camp no és cultivable. Mentre que quan les pluges s'apropaven els obrers podien anar a cultivar els seus conreus, com ha passat en els mesos que aquest segon informe de seguiment comprèn.

5.3. Recomanacions pràctiques sobre el projecte.

La bona acollida en les institucions corresponents del projecte, el treball de l'AAEPS i, sobretot, l'experiència i capacitat de treball de la gent que fa la seva feina al Senegal han fet que el projecte sigui, ara per ara, un èxit. Cal, però, començar a pensar que pugui funcionar molt de temps i que els seus beneficiaris puguin rebre el servei que es mereixen. És per això que per al proper any ens hem animat a promoure l'ampliació del projecte amb la construcció d'un pou, que garantirà el subministrament d'aigua dolça, i també la portada de l'electricitat, que beneficiarà el funcionament del centre, i permetrà ampliar les hores d'estudi dels alumnes; a més, se'n veuran beneficiats en primer lloc, l'escola de secundària que es troba als terrenys veïns i en segon lloc les persones que pel camí es podran connectar a la nova línia.

Podem assegurar que el nostre serà el centre més econòmic per a les famílies dels que hi ha en aquesta regió. Però per això cal anar pensant en una campanya de beques a Catalunya per a que els molts nois i noies de la regió puguin seguir els seus estudis.

6. INFORME DE SITUACIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE

El quadre següent relaciona les despeses existents fins la segona quinzena del mes de novembre de 2003. Totes tenen una còpia del corresponent justificant a la part de l'annex i l'original està dipositat als arxius de la nostra entitat, a disposició de qui vulgui consultar-los. El fet que sempre es contracti persones de la zona fa que en algunes ocasions la factura sigui una mica precària, però generalment porta un segell de l'emissor, i en tot cas, aquests són els casos menys freqüents.

Els responsables han visitat altres centres per demanar consell als educadors que els dirigeixen. Hem preguntat com organitzen la cuina i quina és la col·laboració que demanen als alumnes que hi viuen. Entre les factures d'aquest semestre n'hi ha

encara moltes de carburant; és perquè gran part d'aquestes corresponen a les visites als centres de Mbar, Kedougou, Oussouye, Mlomp, diembering, Foundione, Kafrine, Gossas, N dofane i Dakar i d'altres són resultat dels transports que s'han fet amb vehicles propis quan la poca quantitat de material a transportar feia enormement car el lloguer d'un camió.

En el moment de tancar l'informe ja s'han enviat la totalitat dels diners compromesos per aquest any, malgrat que no s'ha disposat de les subvencions fins el mes de desembre. Per altra banda, la construcció amb aquests darrers diners s'executarà durant el primer semestre de 2004.

Una observació important per a la lectura d'aquest informe i l'anterior és que els diners que s'han transferit al Senegal són els rebuts a través de la subvenció vehiculada a través del Fons Català, més els recursos obtinguts per l'Associació d'amics de l'Escola Pia al Senegal amb la seva labor de sensibilització, sempre amb l'ajut d'altres col·lectius integrats en la gran família que és l'Escola Pia de Santa Anna a Mataró.


Concepte	Fr CFA	Euros
Aportació AAEPS de Mataró	23.614.452	36.220,48
Aportació local	6.150.000	9.433,04
TOTAL INGRESSOS ANTERIORS	29.764.452	45.653,52
Nova aportació AAEPS de Mataró	3.924.042	6.018,80
TOTAL INGRESSOS	33.688.494	51.672,32

Concepte	Núm.Just.	Fr CFA	Euros
Anterior		22.367.410	34.307,74
Ciment	68	615.000	943,30
Ferro	69	49.500	75,92
Carburant	70	10.000	15,34
Material elèctric	71	7.250	11,12
Uralites	72	308.400	473,03
Material elèctric	73	20.550	31,52
Aigua	74	5.000	7,67
Fotocòpies	75	5.025	7,71
Mà d'obra paleta	76	50.000	76,69
Material elèctric	77	15.050	23,08
Carburant	78	10.500	16,11
Claus (ferro)	79	9.500	14,57
Construcció tanca	80	15.000	23,01
Mà d'obra fuster	81	20.000	30,68
Carburant	82	12.600	19,33
Carburant	83	8.880	13,62
Material elèctric	84	53.500	82,06
Fotocòpies	85	2.100	3,22
Claus (ferro)	86	1.850	2,84
Carburant	87	10.000	15,34
Mat. Elèctric i construcció	88	49.450	75,85
Material elèctric	89	15.250	23,39
Material elèctric	90	12.350	18,94
Carburant	91	8.400	12,88

Fotocòpies	92	750	1,15
Planxes i taulons fusta	93	82.500	126,54
Carburant	94	10.000	15,34
Carburant	95	9.540	14,63
Carburant	96	10.000	15,34
Serrar taulons	97	700	1,07
Carburant	98	17.000	26,08
Frontisses	99	7.200	11,04
Portes WC	100	21.000	32,21
Carburant	101	6.100	9,36
Carburant	102	3.640	5,58
Material elèctric	103	2.050	3,14
Aigua	104	5.000	7,67
Material elèctric	105	5.850	8,97
Pintura	106	90.000	138,04
Carburant	107	11.900	18,25
Llits	108	277.400	425,48
Ciment	109	213.500	327,47
Ferro	110	66.000	101,23
Carburant	111	16.500	25,31
Material elèctric	112	2.350	3,60
Ciment	113	61.000	93,56
Material elèctric	114	33.250	51,00
Telèfon	115	2.000	3,07
Carburant	116	10.000	15,34
Sou vigilant	117	30.000	46,01
Desherbar	118	10.000	15,34
Pintura	119	721.900	1.107,27
Paletes i Fusters	120	2.000.000	3.067,65
Pintura	121	13.300	20,40
Carburant	122	14.000	21,47
Pales	123	5.750	8,82
Material cuina	124	61.790	94,78
Fusta	125	7.000	10,74
Grava	126	150.000	230,07
Sorra	127	14.000	21,47
Calculadora	128	2.500	3,83
Carburant	129	16.000	24,54
Lampista	130	35.000	53,68
Paper de vidre	131	1.000	1,53
Material elèctric	132	3.500	5,37
Maons	133	2.000	3,07
Claus (ferro)	134	3.500	5,37
Tiges ferro	134b	22.500	34,51
Ferro i transport	135	37.300	57,21
Taulons fusta	136	27.500	42,18
Cola i claus	137	1.750	2,68
Carburant	138	10.000	15,34
Carburant	139	10.050	15,41
Matalassos	140	281.000	431,01
Fotocòpies	141	600	0,92
Matalassos	142	79.000	121,17

Matalassos	143	98.000	150,32
Llits	144	1.086.500	1.666,50
Llits	145	50.000	76,69
Dipòsit aigua	146	600.000	920,30
Carburant	147	16.500	25,31
Grava	148	160.000	245,41
Material cuina	149	32.450	49,77
Material cuina	150	88.350	135,51
Làmpades de Gas	151	102.000	156,45
Material cuina	152	167.450	256,84
Material cuina	153	17.100	26,23
Manxons gas	154	1.400	2,15
Carburant	155	5.000	7,67
Pilota	156	5.000	7,67
Eines	157	17.000	26,08
Material cuina	158	2.500	3,83
Aixetes	159	2.950	4,52
Material cuina	160	74.350	114,04
Carretes	161	31.000	47,55
Ciment	162	30.500	46,78
Carburant	163	10.000	15,34
Material cuina	164	15.000	23,01
Tubs per aigua	165	18.300	28,07
Aixetes	166	10.950	16,80
Mà d'obra lampista	167	10.000	15,34
Carburant	168	2.400	3,68
Taula de treball	169	10.000	15,34
Cremador Gas	170	7.000	10,74
Sessió Oussouye	171	62.500	95,86
Carburant	172	14.200	21,78
Sessió Oussouye	173	6.000	9,20
Carburant	174	9.000	13,80
Ciment	175	30.000	46,01
Benzina	176	4.800	7,36
Pilota	177	12.000	18,41
Cubells	178	1.500	2,30
Deshherbar	179	20.000	30,68
Sou vigilant	180	30.000	46,01
Sorra	181	14.000	21,47
Aigua	182	5.000	7,67
Armaris	183	130.000	199,40
Carburant	184	16.000	24,54
Bateria	185	56.000	85,89
Carburant	186	7.000	10,74
Sorra	187	14.000	21,47
Paletes	188	100.000	153,38
Sou vigilant	189	10.000	15,34
	2on. Semestre	9.055.025	13.888,84
	Total despesa	31.422.435	48.196,58
	Saldo	2.266.059	3.475,74

7. IMATGES DEL CENTRE CORRESPONENTS A AQUEST PERIODE

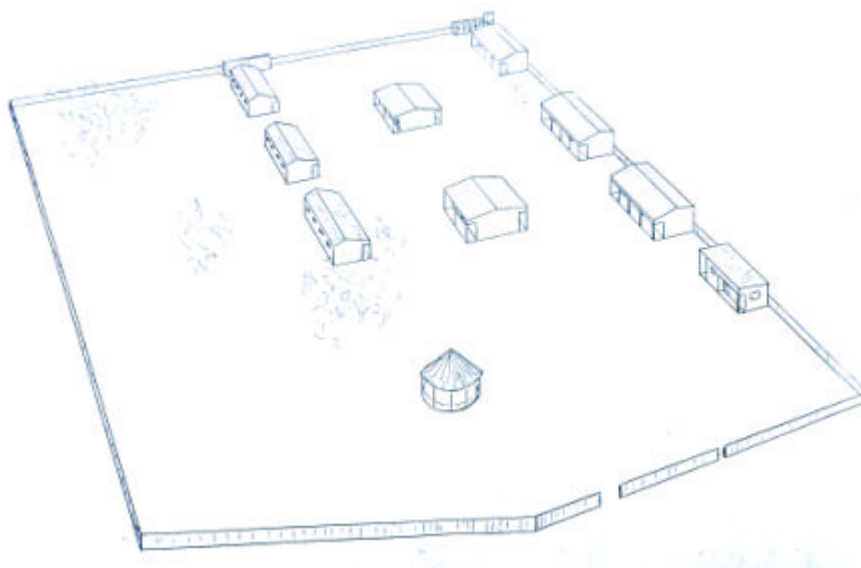

Dibuix de la distribució dels habitatges i serveis previstos al centre



Estat del terreny després del període de pluges, quan encara no havien arribat els alumnes.



Una de les casetes amb capacitat per a vuit alumnes



Interior d'un dels habitatges



En primer terme la cuina i el rebost, darrera dues de les casetes

Annexos

L'informe lliurat al FCCD inclou els justificants de pagament corresponents a la relació inclosa en l'informe de situació econòmica del projecte.
